







Athugasemdir við völl

1. Gerðar hafa verið athugasemdir við gæði vallar og hversu ójafn hann var (57 cm)
2. Gerðar hafa verið athugasemdir við lýsingu vallarins
3. Gerðar hafa verið athugasemdir við búningsklefa og aðstöðu liða í kjallara
4. Gerðar hafa verið athugasemdir við mögulegan fjölda áhorfenda á vellinum og aðstöðu þeirra.

Völlurinn hefur lengi verið á undanþágu til keppnishalds og lengi hefur staðið til að fara í lagfæringar á þessum atriðum



Birgjar

- Steypustöðin
- Urð og Grjót



RDALSVOLLUR
PEPSI

Við erum öll í sama liði
ÍSLANDAR

fyrir Ísland
LENGJAU
PEPSI
Við erum öll í sama liði
ÍSLANDAR











Laugardalsvöllur
Nóvember 2024 til janúar 2025



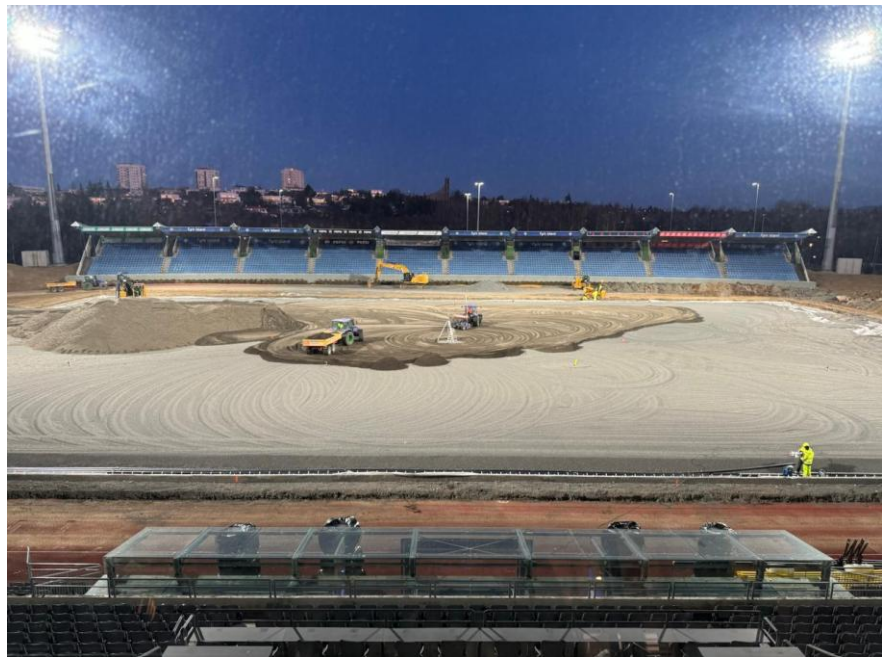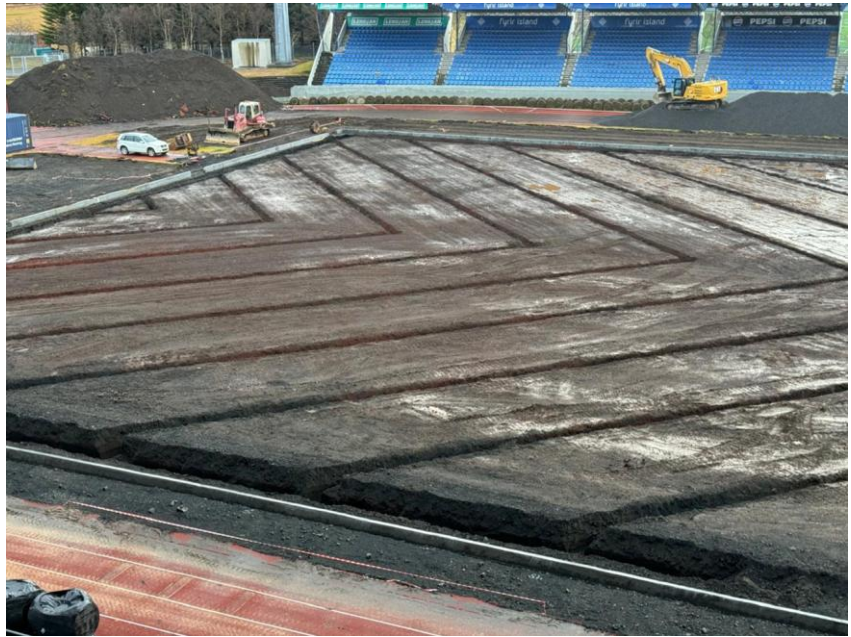










U R

Við erum öll í sama líði









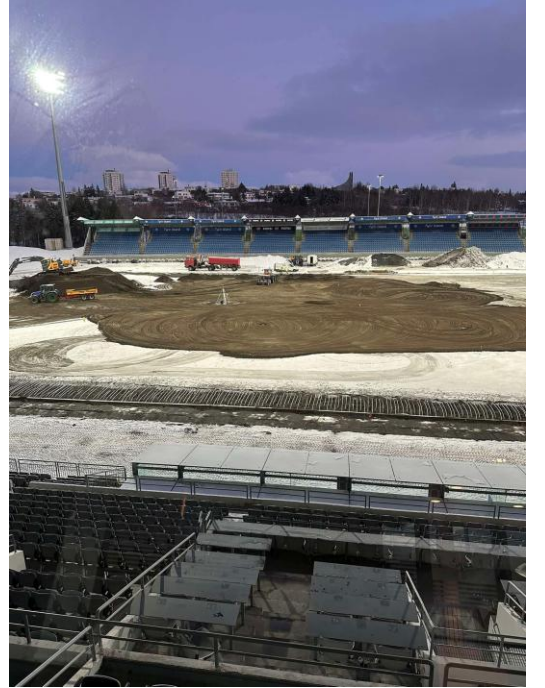
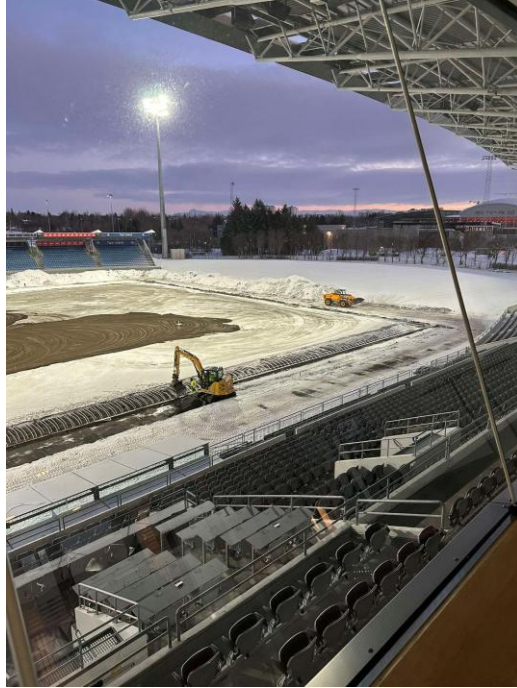
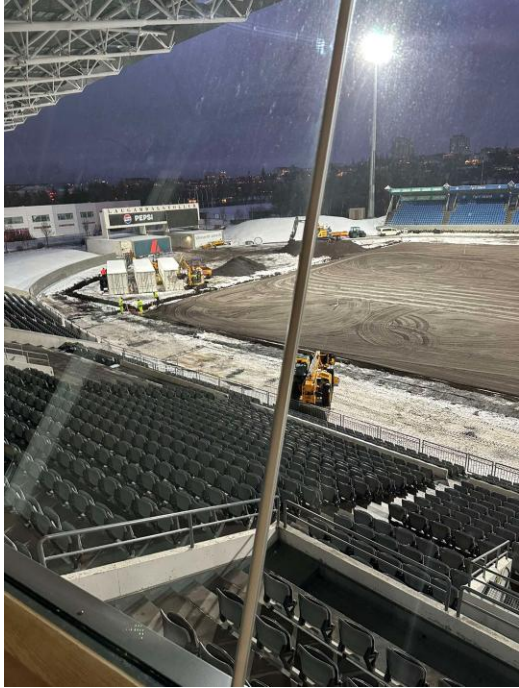






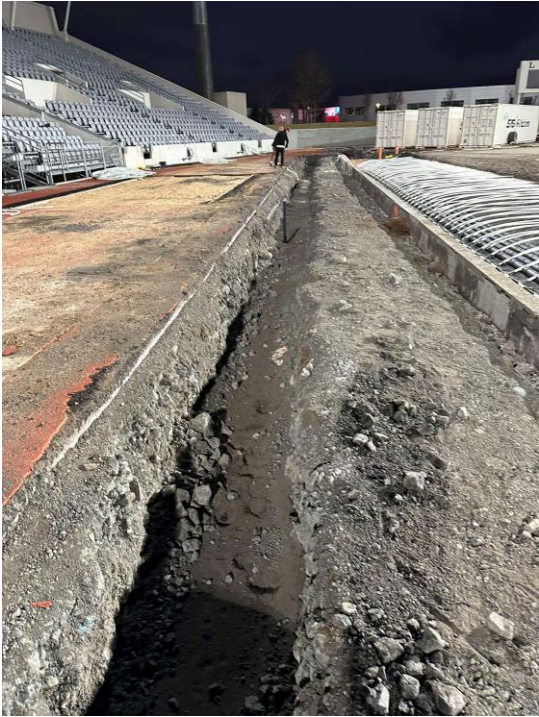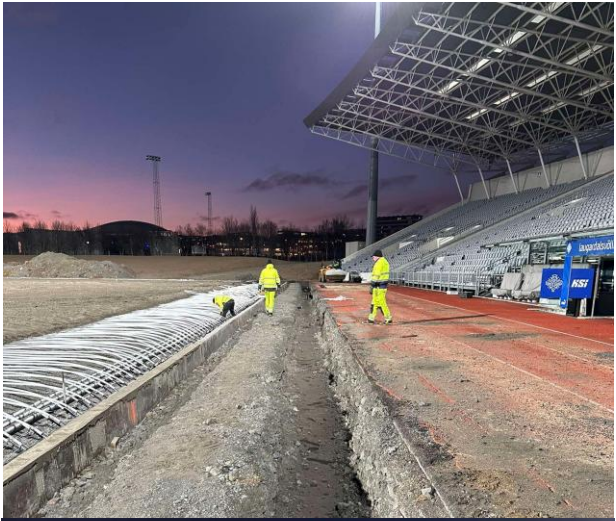



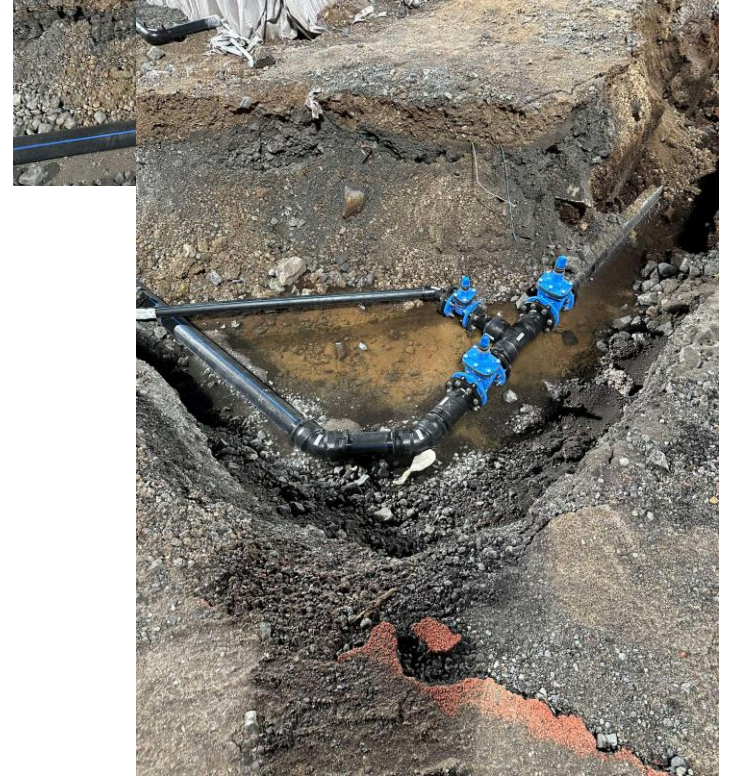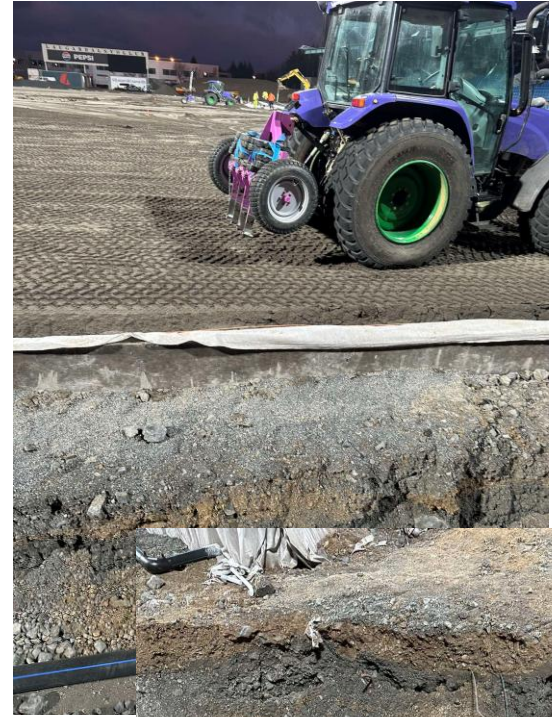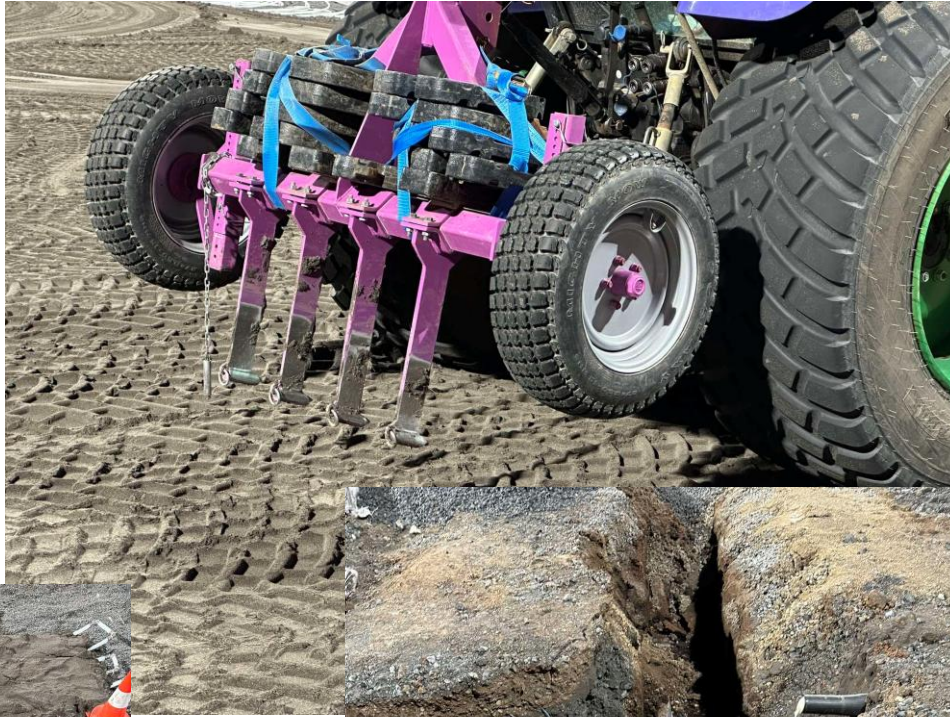

















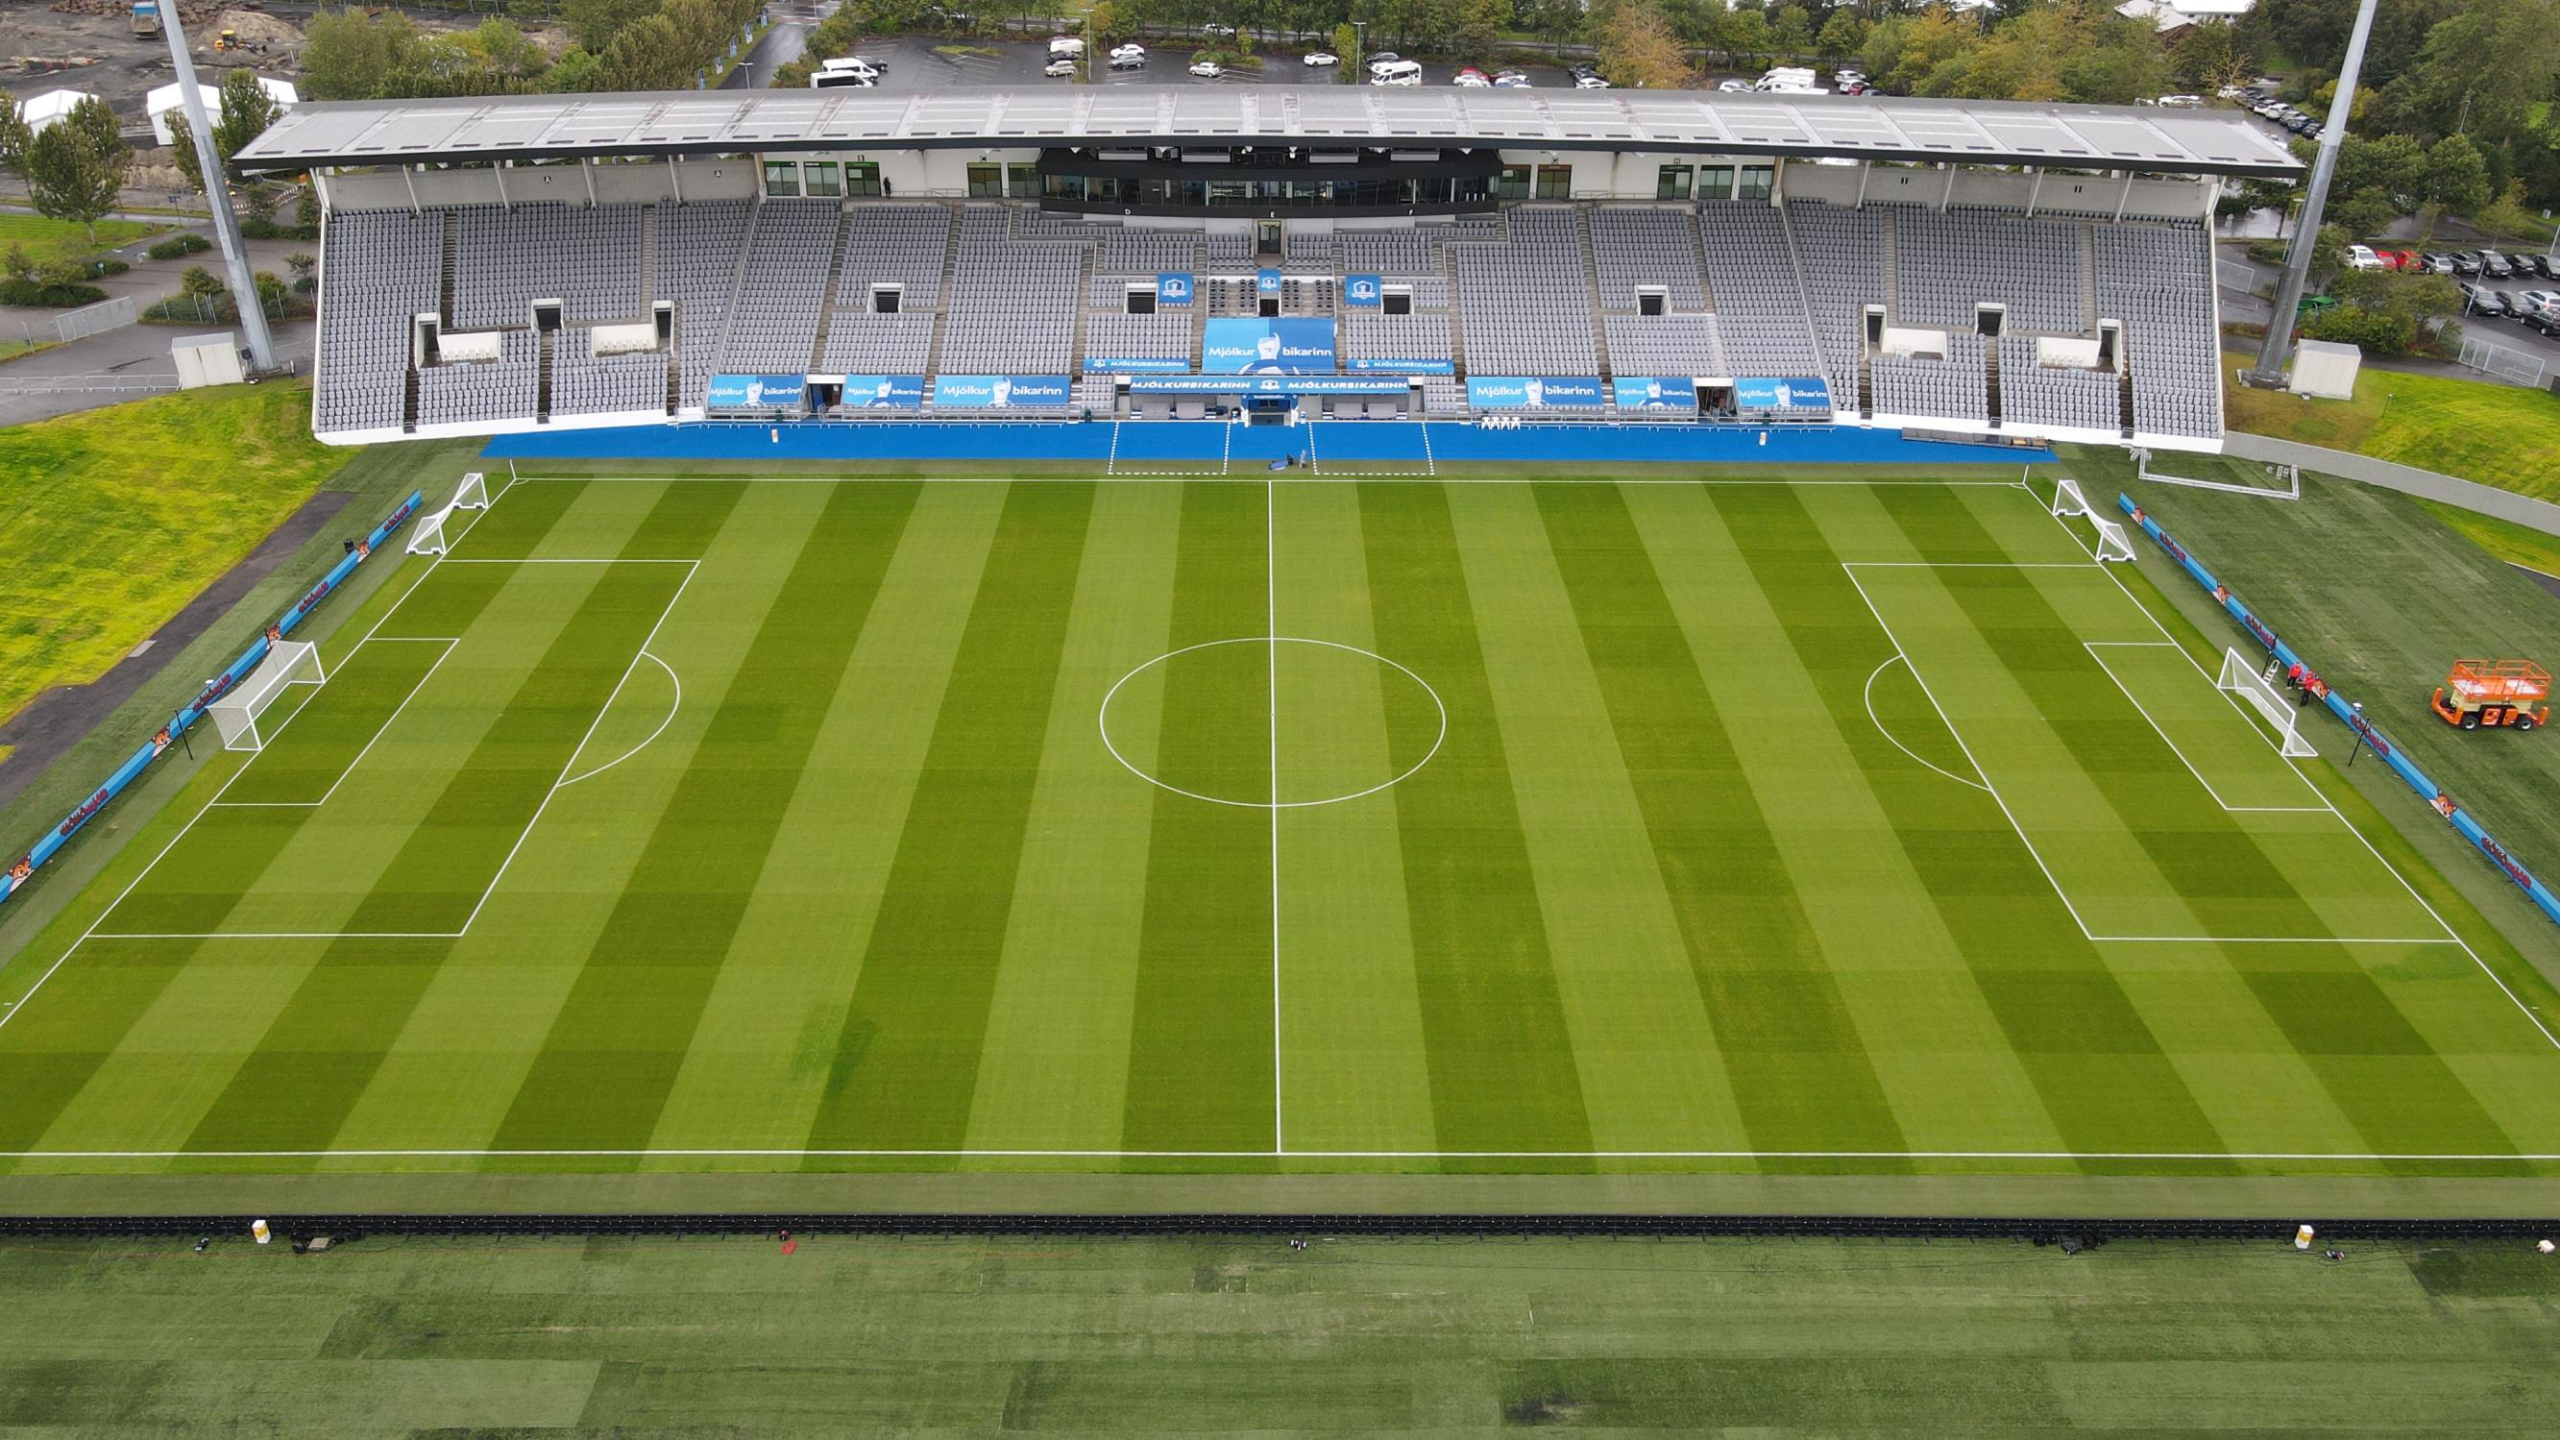


Tímalína

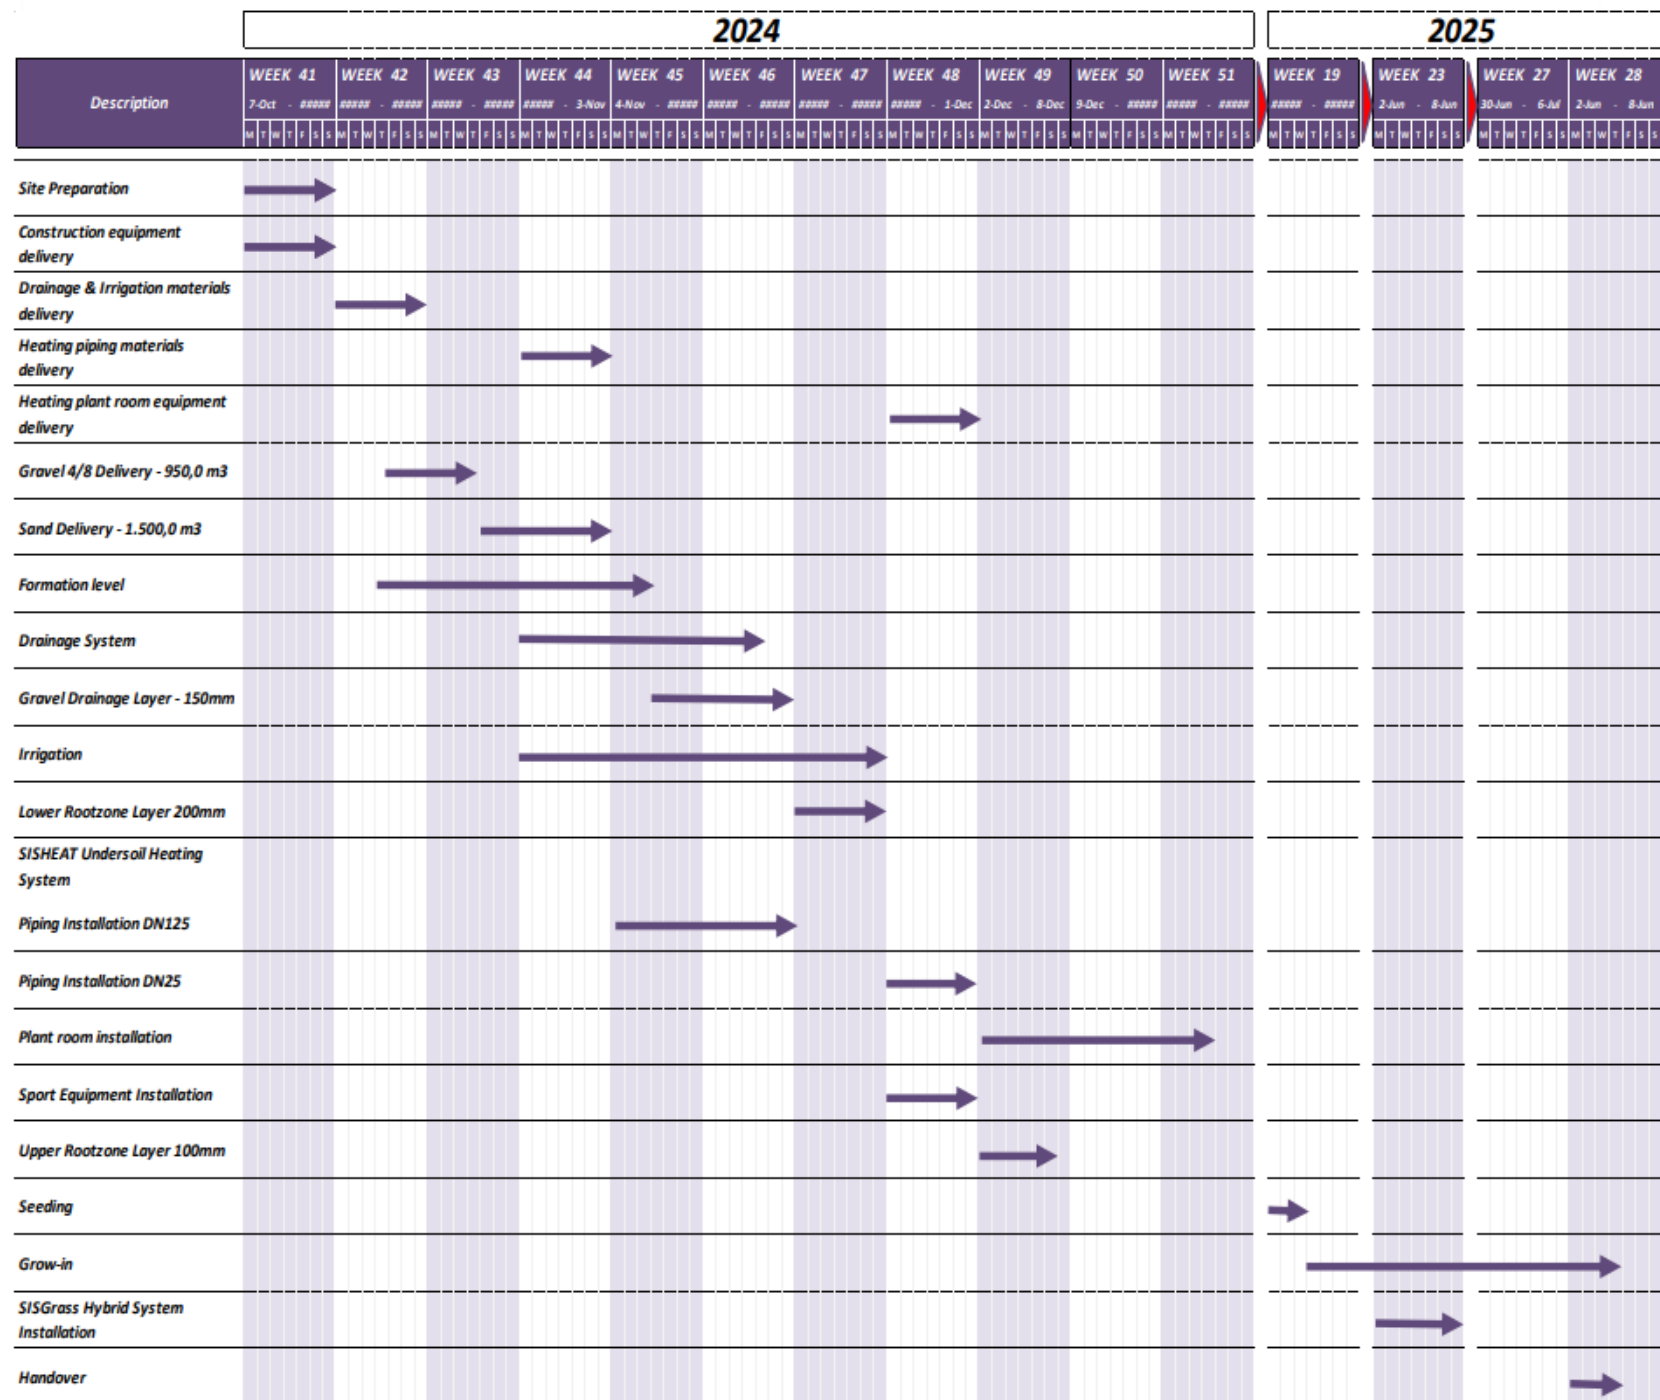




Gerðar hafa verið athugasemdir við lýsingu vallarins reglulega og farið fram á úrbætur. Nauðsynlegt reyndist að fara í viðgerðir á lýsingunni til að tryggja að heimaleikur Íslands Ísland-Aserbaísjan þann 5 september gæti farið fram á vellinum.

Reykjavik Stadium
Date: 23-07-2025
Data: Vertical 0° reference plane

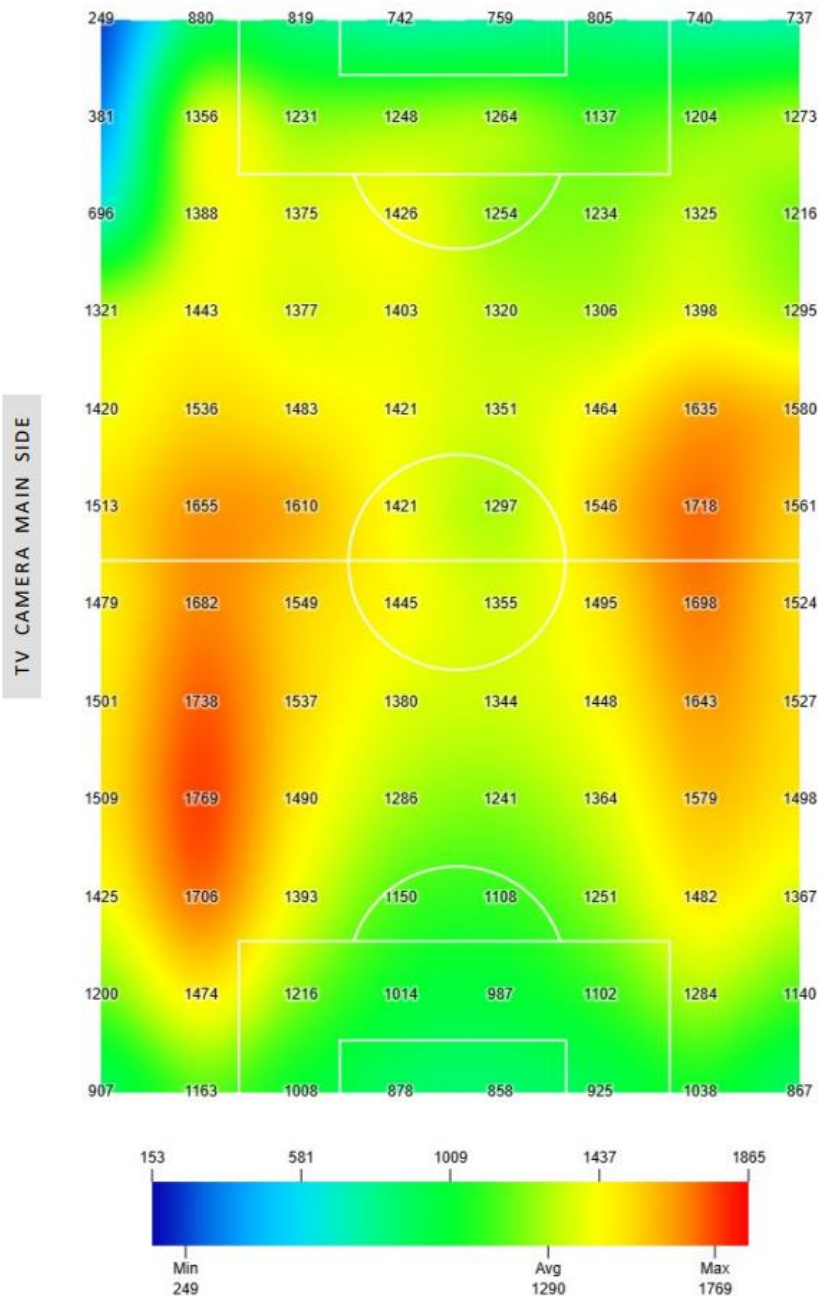

Reykjavik Stadium
Date: 03-10-2025
Data: Horizontal reference plane

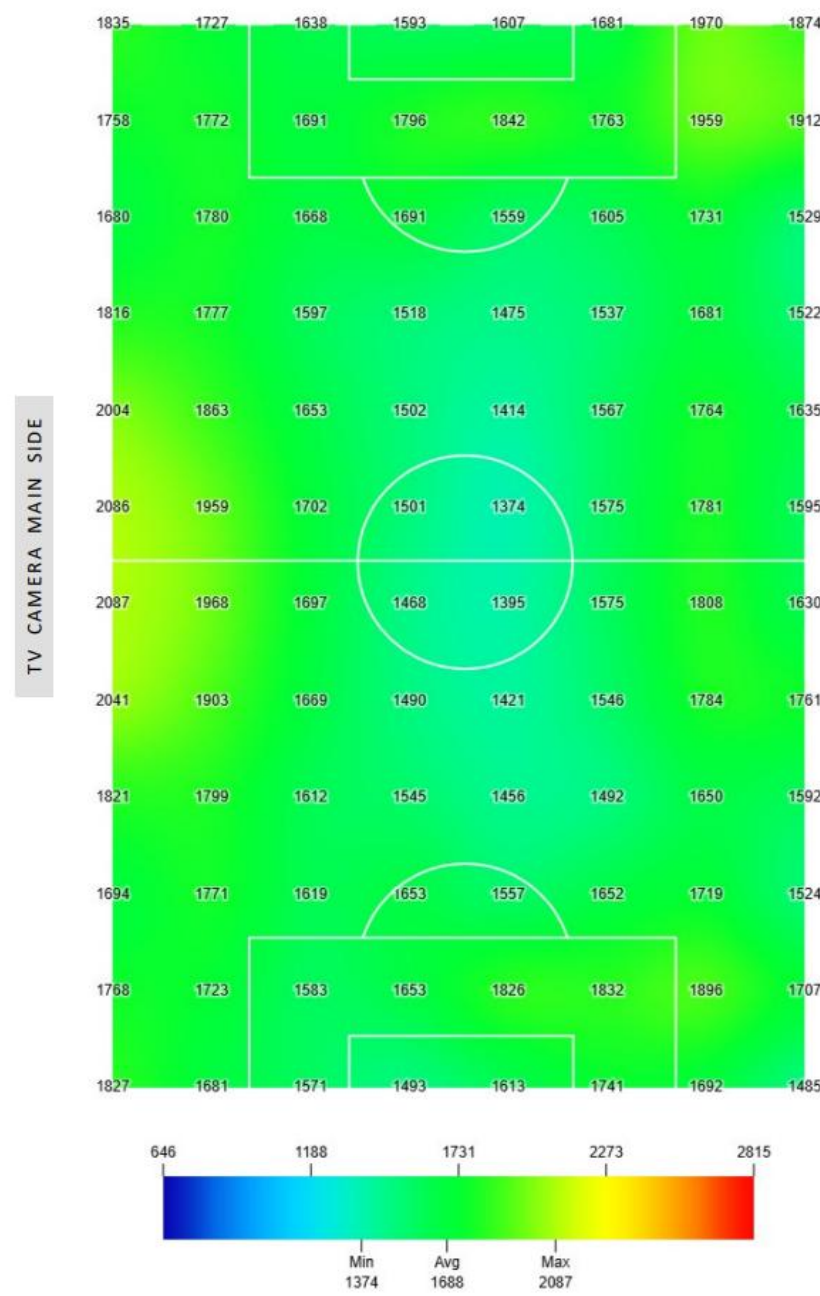

U1: 0.66
U2: 0.81

Uppgjör vallar:

Upphafleg kostnaðaráætlun: 502.009.280.-

Niðurstöðu framkvæmdar skipt niður á verkþætti (bráðabirgðauppgjör)



SIS samningur	283.161.031	55,40%
Undirbúningur og leyfi	784.038	0,15%
Ráðgjafar	26.873.509	5,26%
Flutningur og tollur	18.672.730	3,65%
Efnisinnkaup	52.162.058	10,20%
Vélavinna	60.472.128	11,83%
Aðkeypt þjón.	55.739.898	10,90%
Annar kost	9.826.570	2,60%
Samtals	505.142.844	100,00%


Önnur verk og verkþættir:

Lýsing vallar	59.285.808.-
Umhirðutæki til rekstrar á velli	21.885.952
Yfirbreyðsludúkur	39.500.000.-

Miðað við þessa niðurstöðu fór verkið 0,62% yfir áætlun en KSÍ hefur staðið straum að þeim kostnaði.


Framtíðarhugmyndir

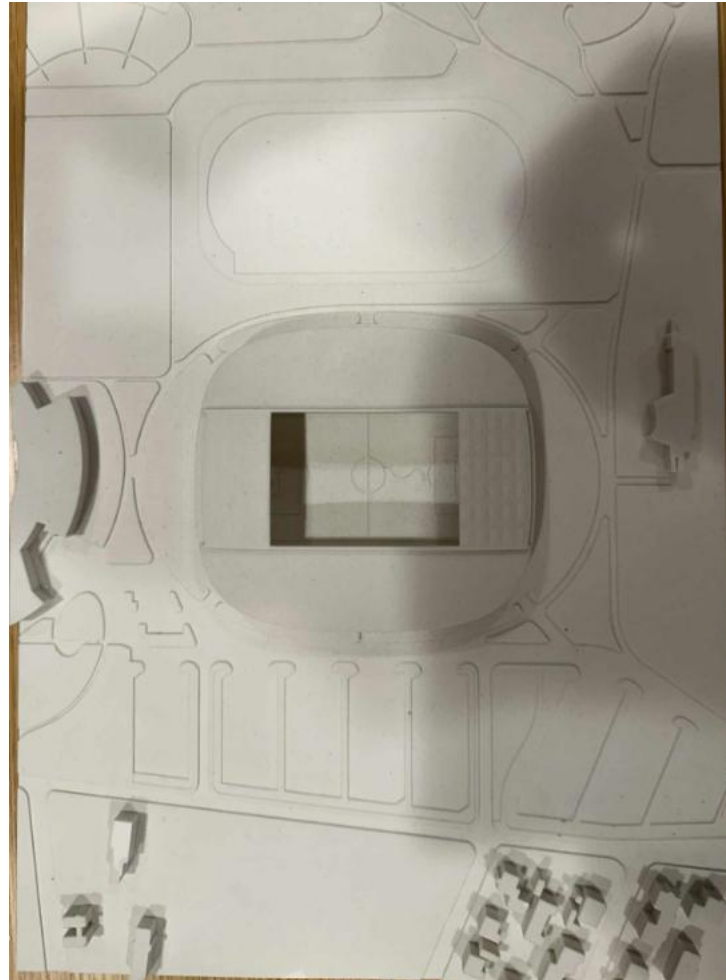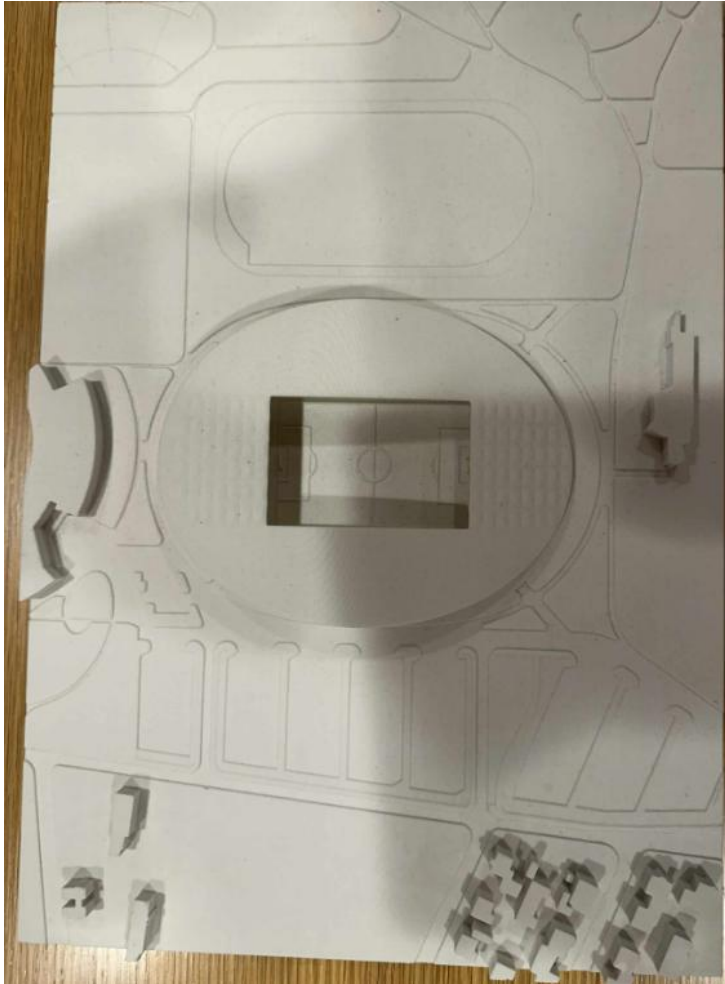

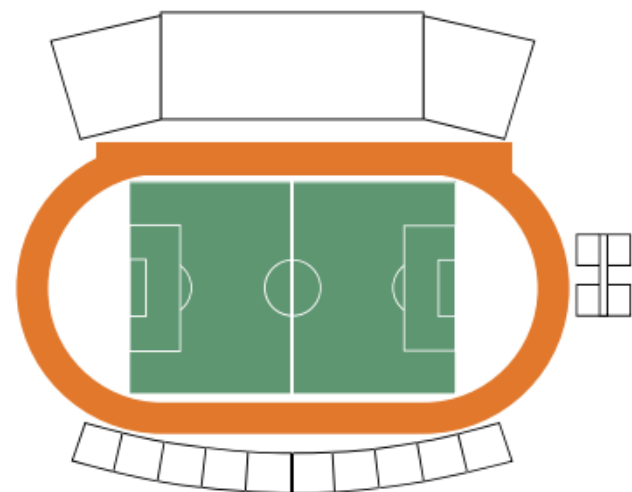


NÚVERANDI STAÐA

Laugardalsvöllur hefur fram til ársins 2024 verið þjóðarleikvangur Íslands. Laugardalsvöllur hefur á sama tíma hýst þjóðarleikvang frjálsíþróttta. Með samkomulagi aðila um að finna frjálsíþróttum nýjan stað, gefst tækifæri á því að byggja upp þjóðarleikvang íslenskrar knattspyrnu til framtíðar.

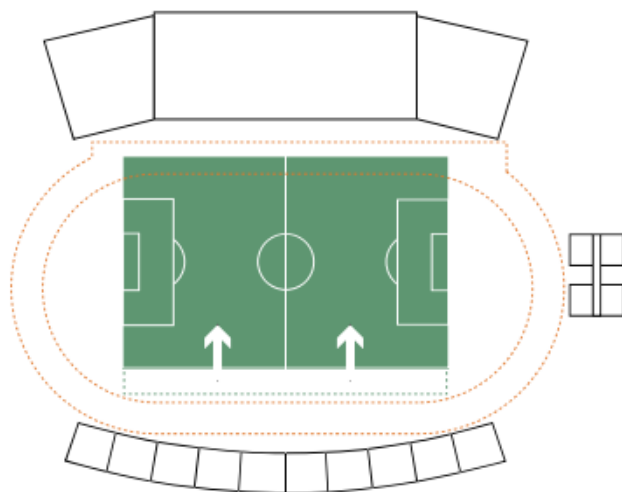


FÆRSLA

Aðalvöllur Laugardalsvallar er færður um 10 metra nær núverandi aðalstúku Laugardalsvallar. Færslan myndar aukna fjarlægð frá núverandi austurstúku.

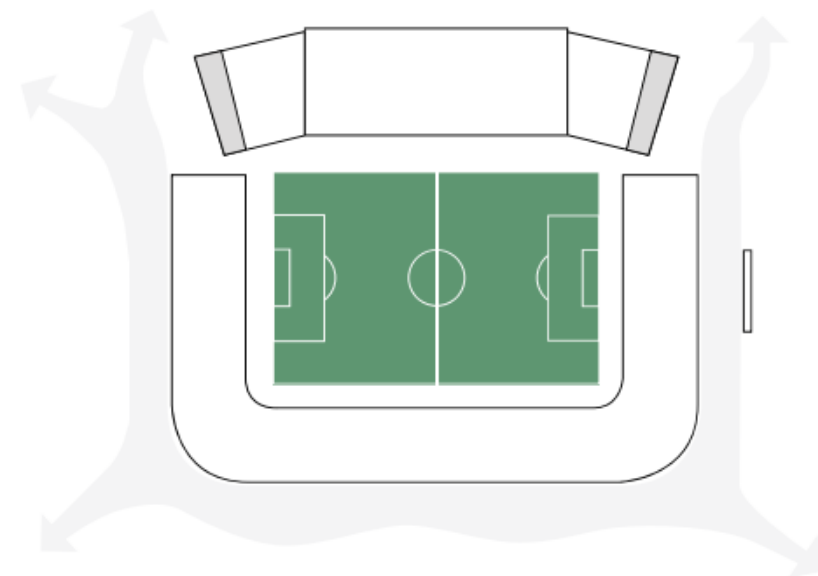


ÞJÓÐARLEIKVANGUR

Með nýrri stúku norðan, austan og sunnanmeginn við völinn mun Laugardalsvöllur verða full endurbyggður með áherslu á knattspyrnu og upplifun leikmanna og áhorfenda.

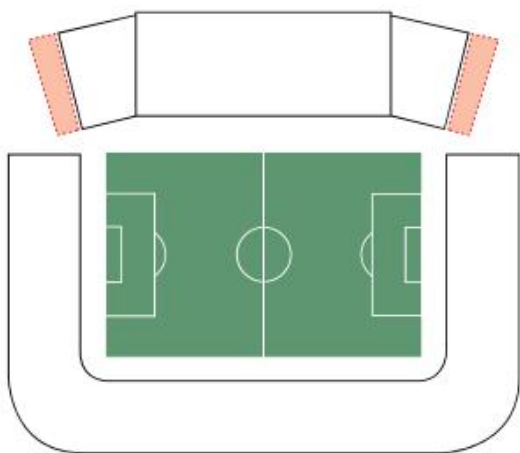


SJÓNSVIÐ

Með nýrri stúku skerðist sjónsvið ystu svæðanna í núverandi aðalstúku. Gert er ráð fyrir að núverandi svæði verði að hluta til nýtt fyrir sjónvarps útsendingar.

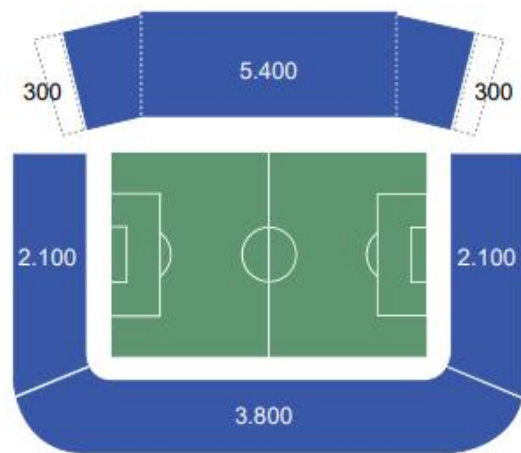


FJÖLDI

Samanlagður sætafjöldi nýs Laugardalsvallar verður um 13.400 talsins. Aðalstúkan skerðist um 600 sæti. Ný stúka mun taka um 8.000 áhorfendur í sæti.

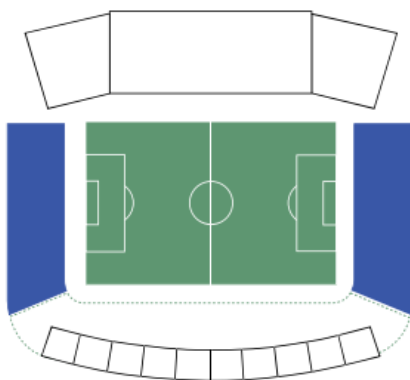


ÁFANGI 1

Fyrsti áfangi nýrrar stúku er á suður og norðurenda vallarins. Núverandi austurstúka er í notkun á meðan framkvæmdum stendur.

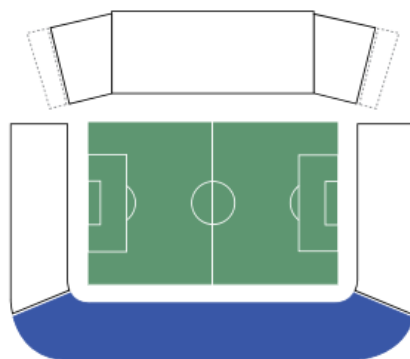

ÁFANGI 2

Annar áfangi nýrra stúku, sem tengir norður- og suðurstúku að austanverðu, myndar eina nýja heild.

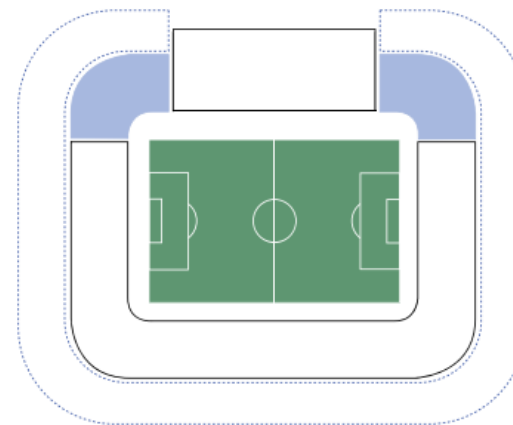

FRAMTÍÐ

Tillagan gefur möguleika á því að stækka Laugardalvöll til framtíðar. Möguleiki er að skeyta nýrri stúku við núverandi aðalstúku með "nýjum" hornum. Einnig er mögulegt að byggja við nýja stúku og auka verulega sætafjölda til framtíðar.

Tilgátumyndir





Baklýst merki
Knattspyrnusambandsins



Götuð ljós áklæðning
beygð í stuðlabergs form

Tröppur og handrið eru úr
sprautulökkuðu stáli

Burðarvirki er úr
forsteyptum einingum


Salerni og þjónusturými
eru staðsett undir
áhorfendapalli

Meðfram áhorfendasvæði
eru setsvæði og svæði fyrir
matarbíla og aðra þjónustu.








Völlurinn og núverandi aðalstúka séð frá nýrri stúku

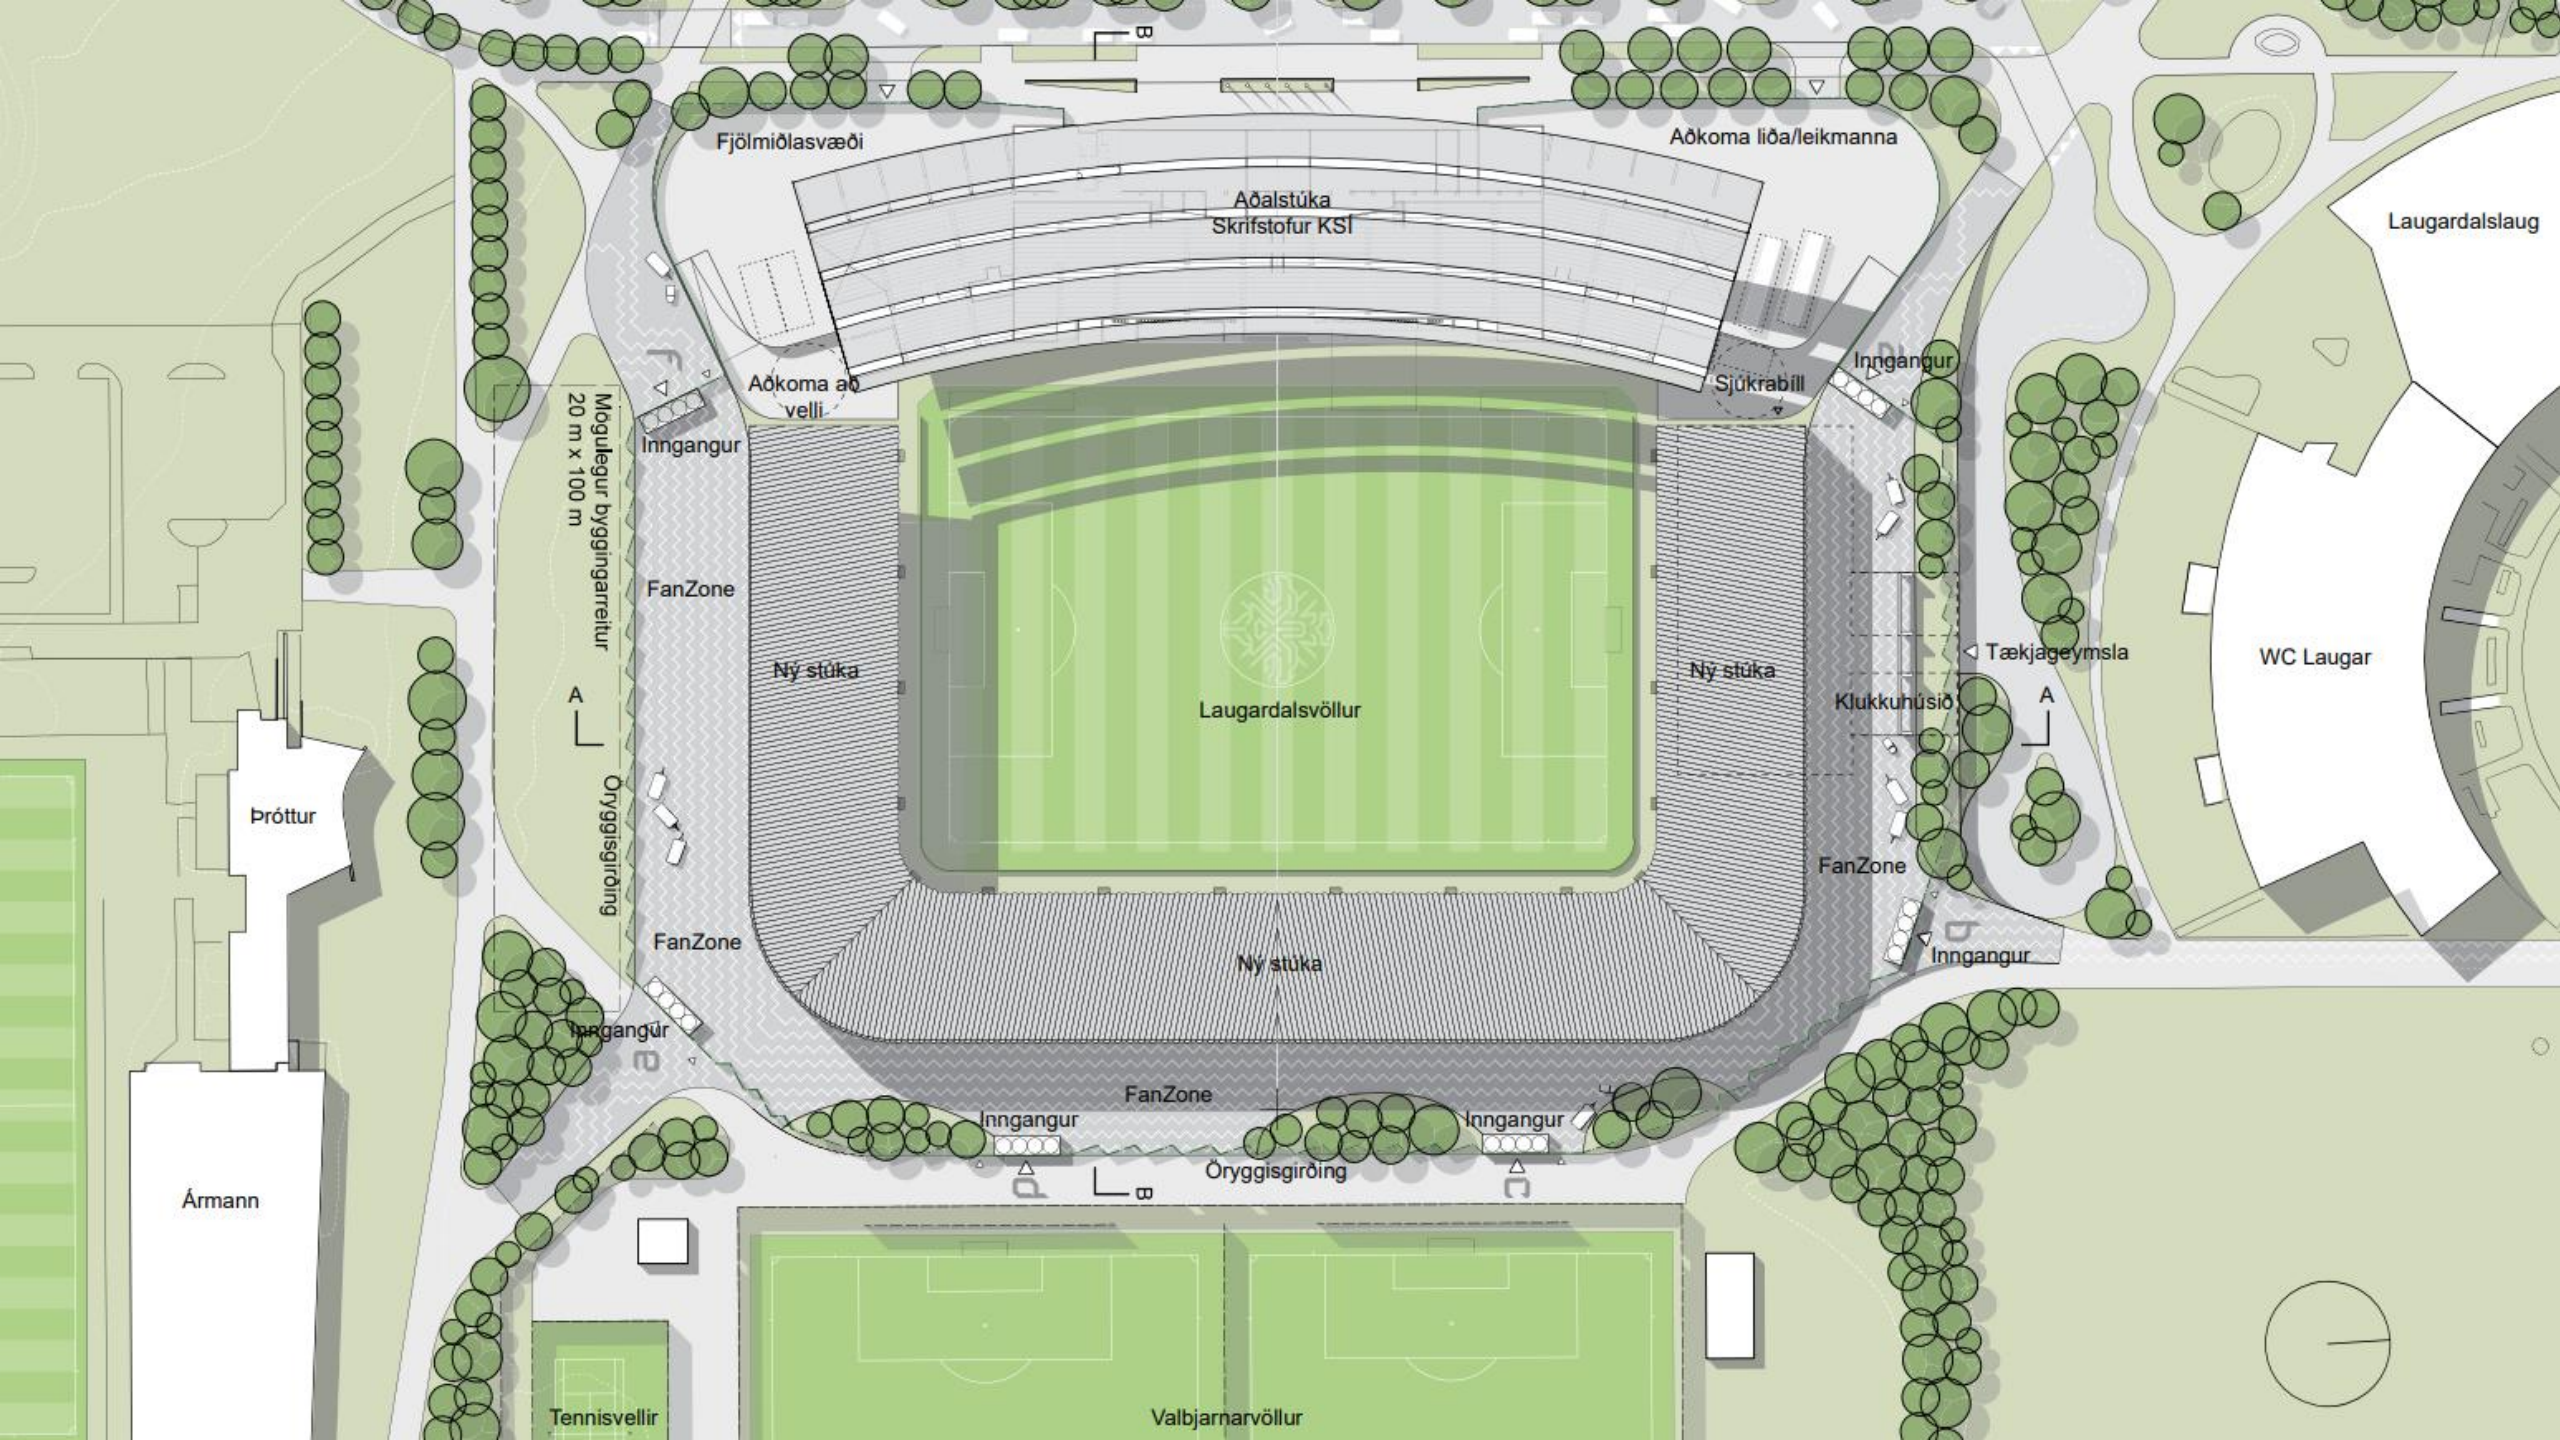

Búningsklefar

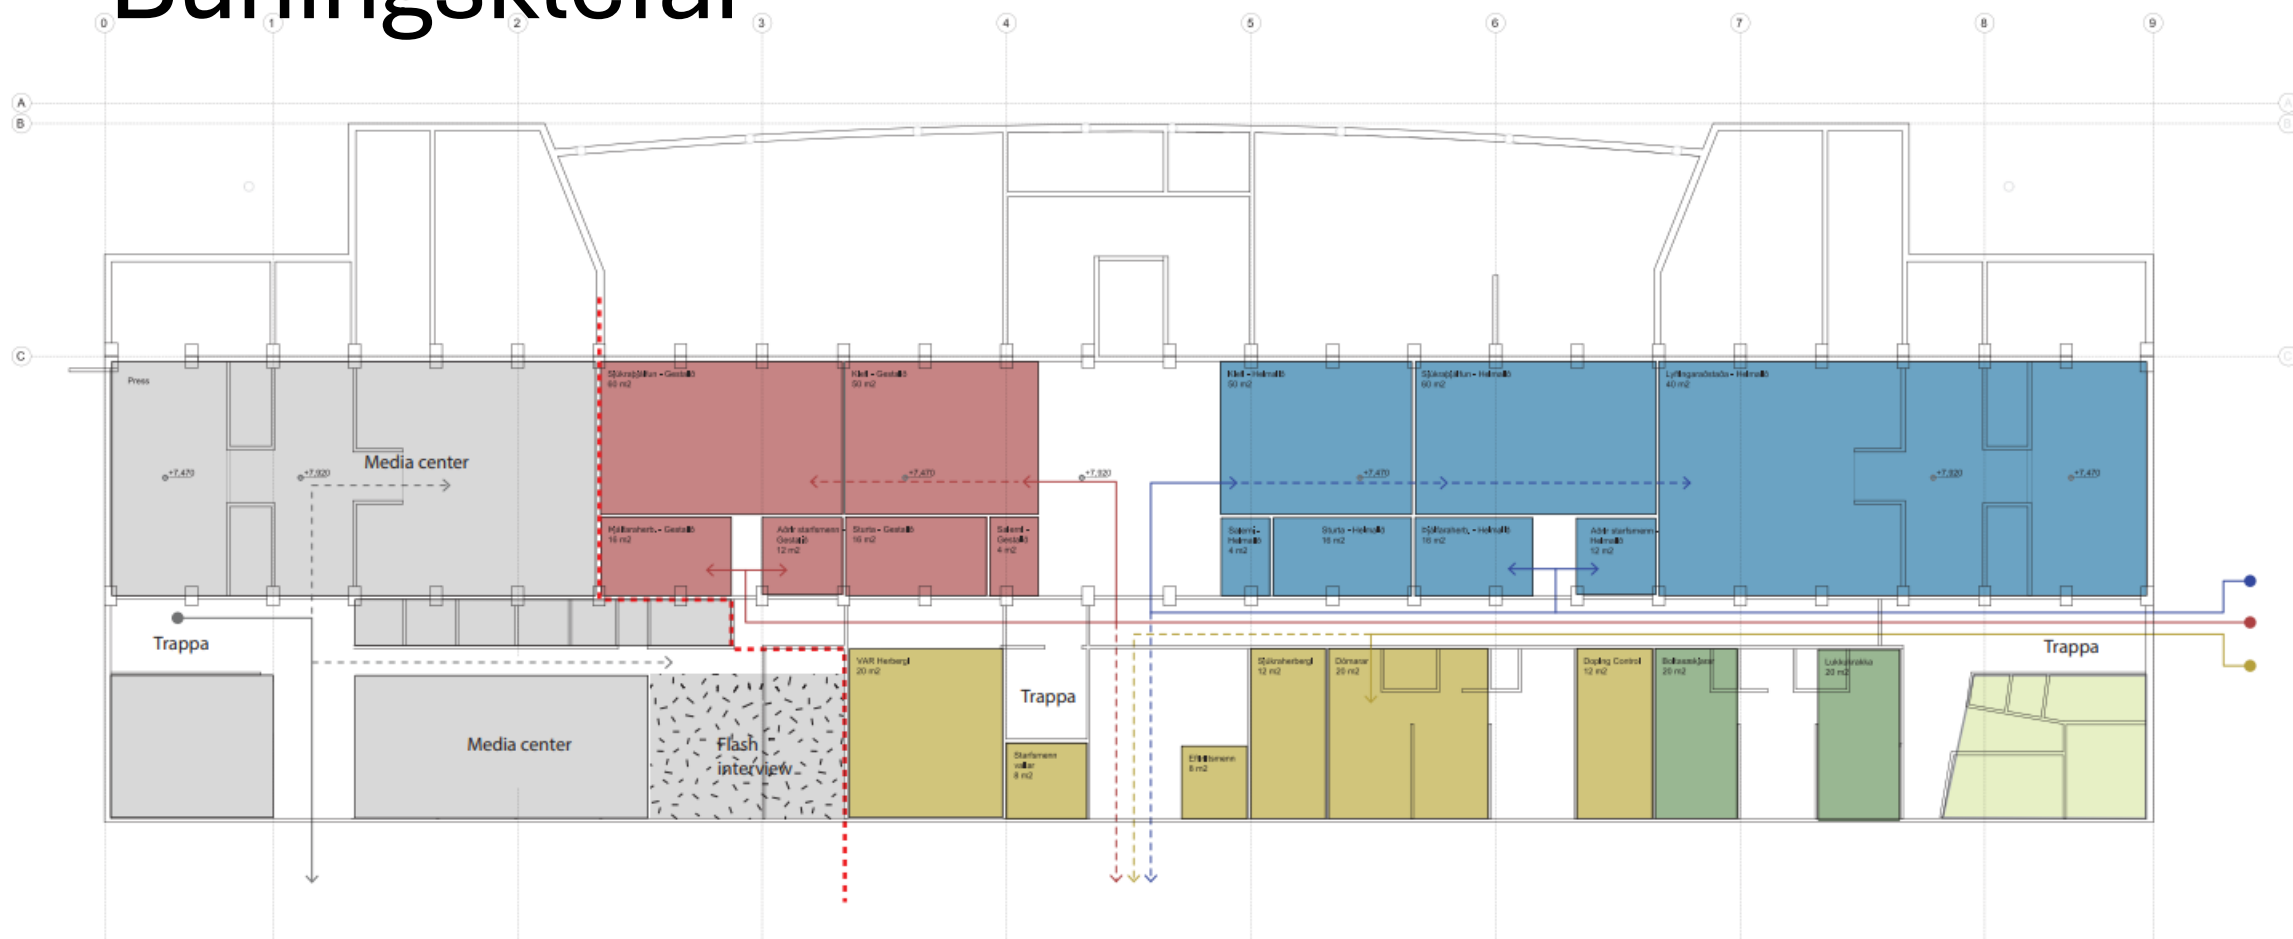

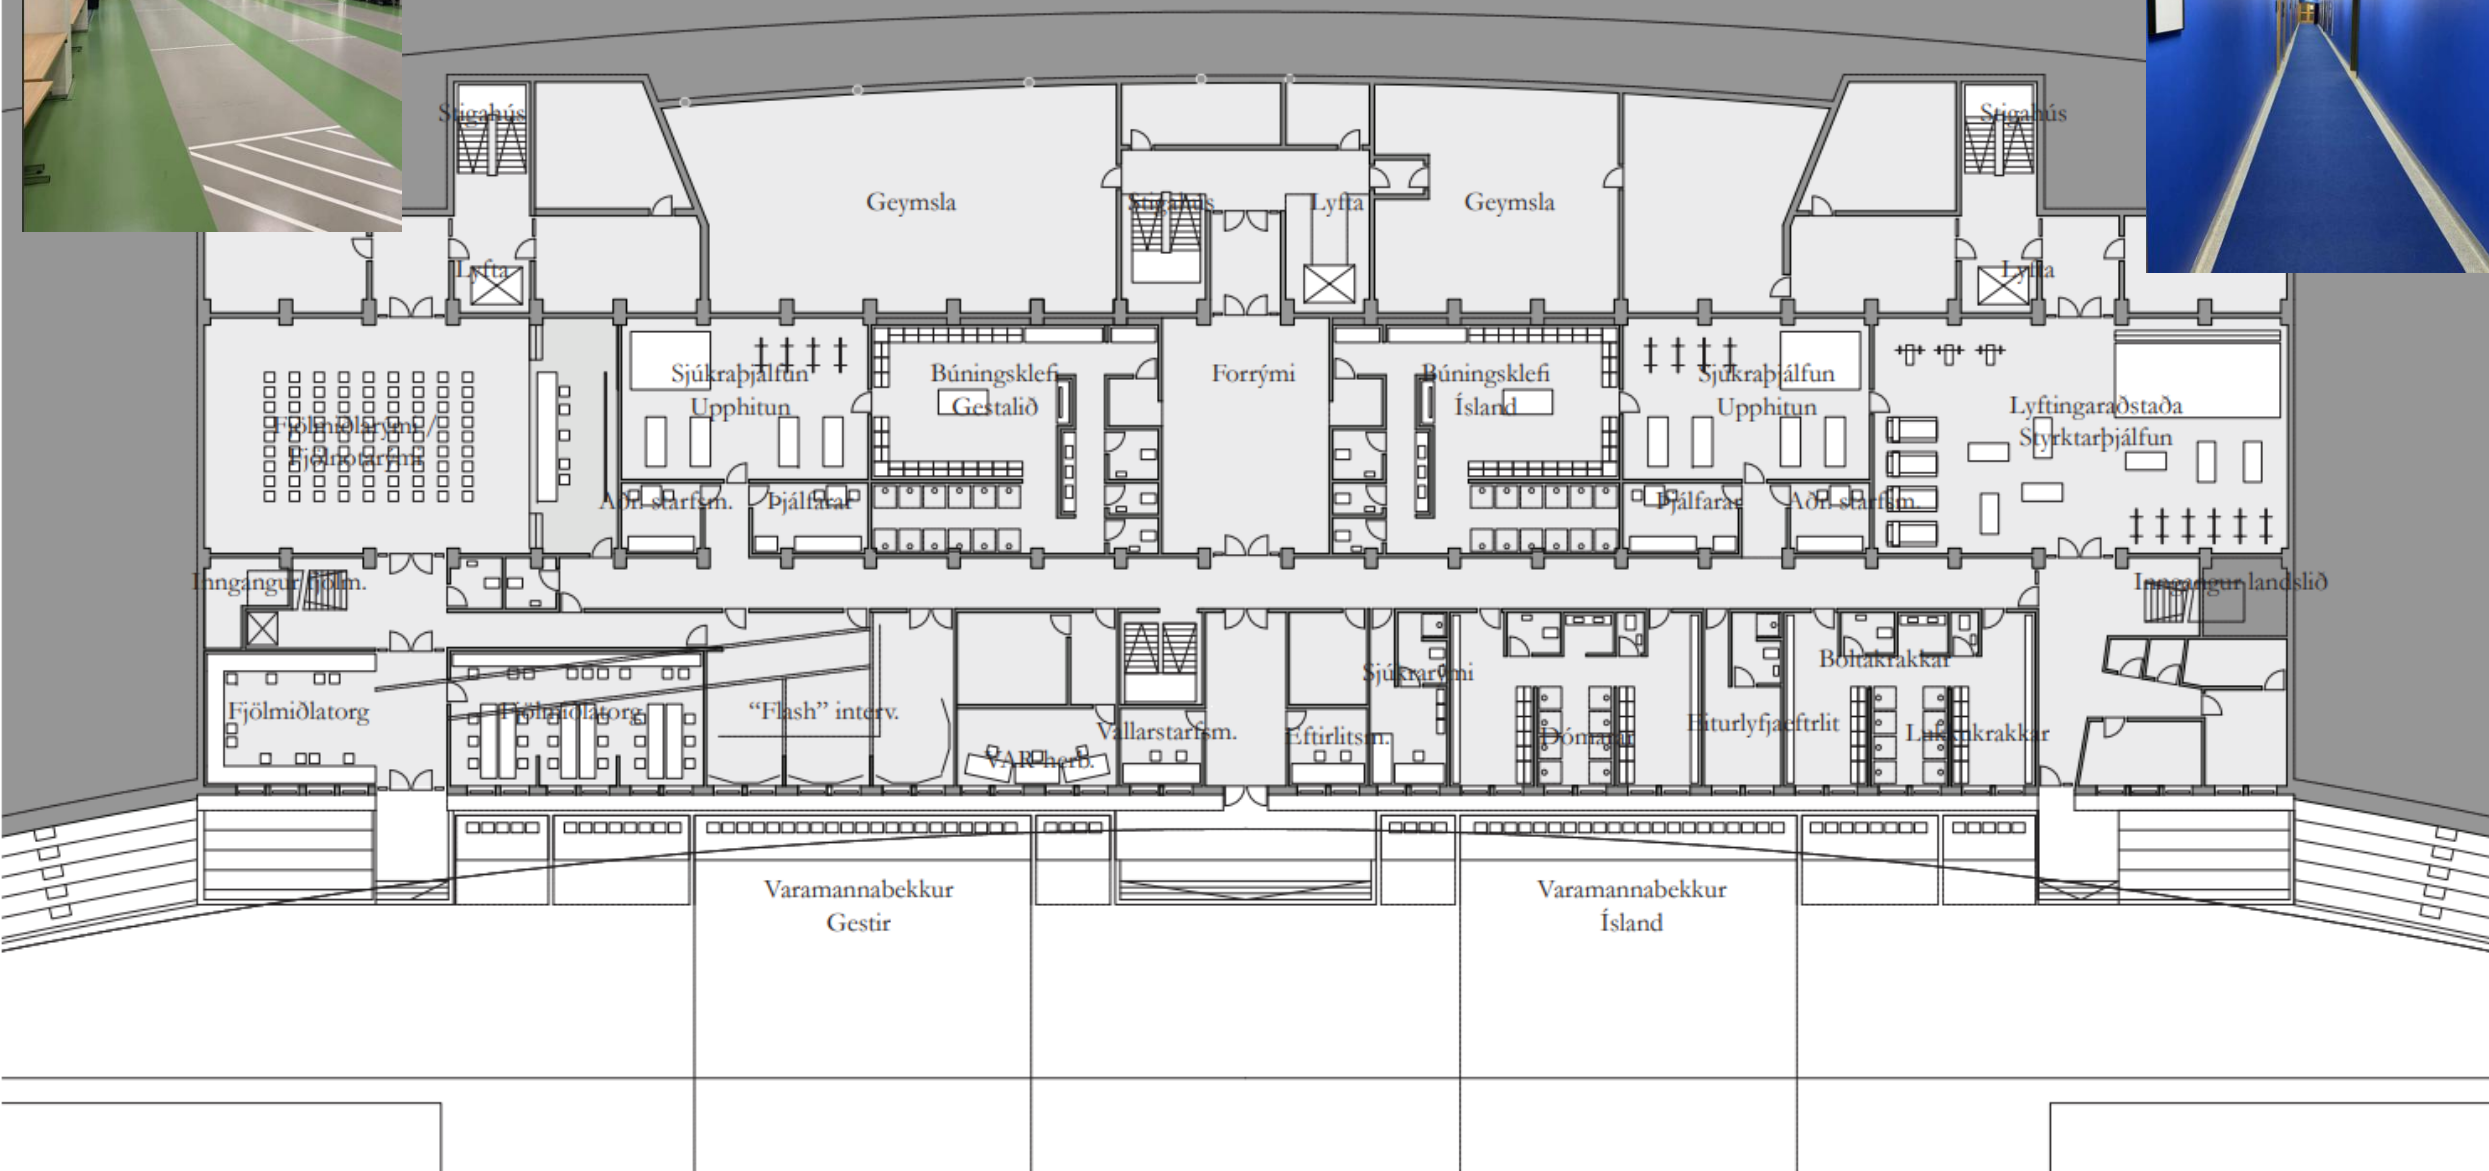

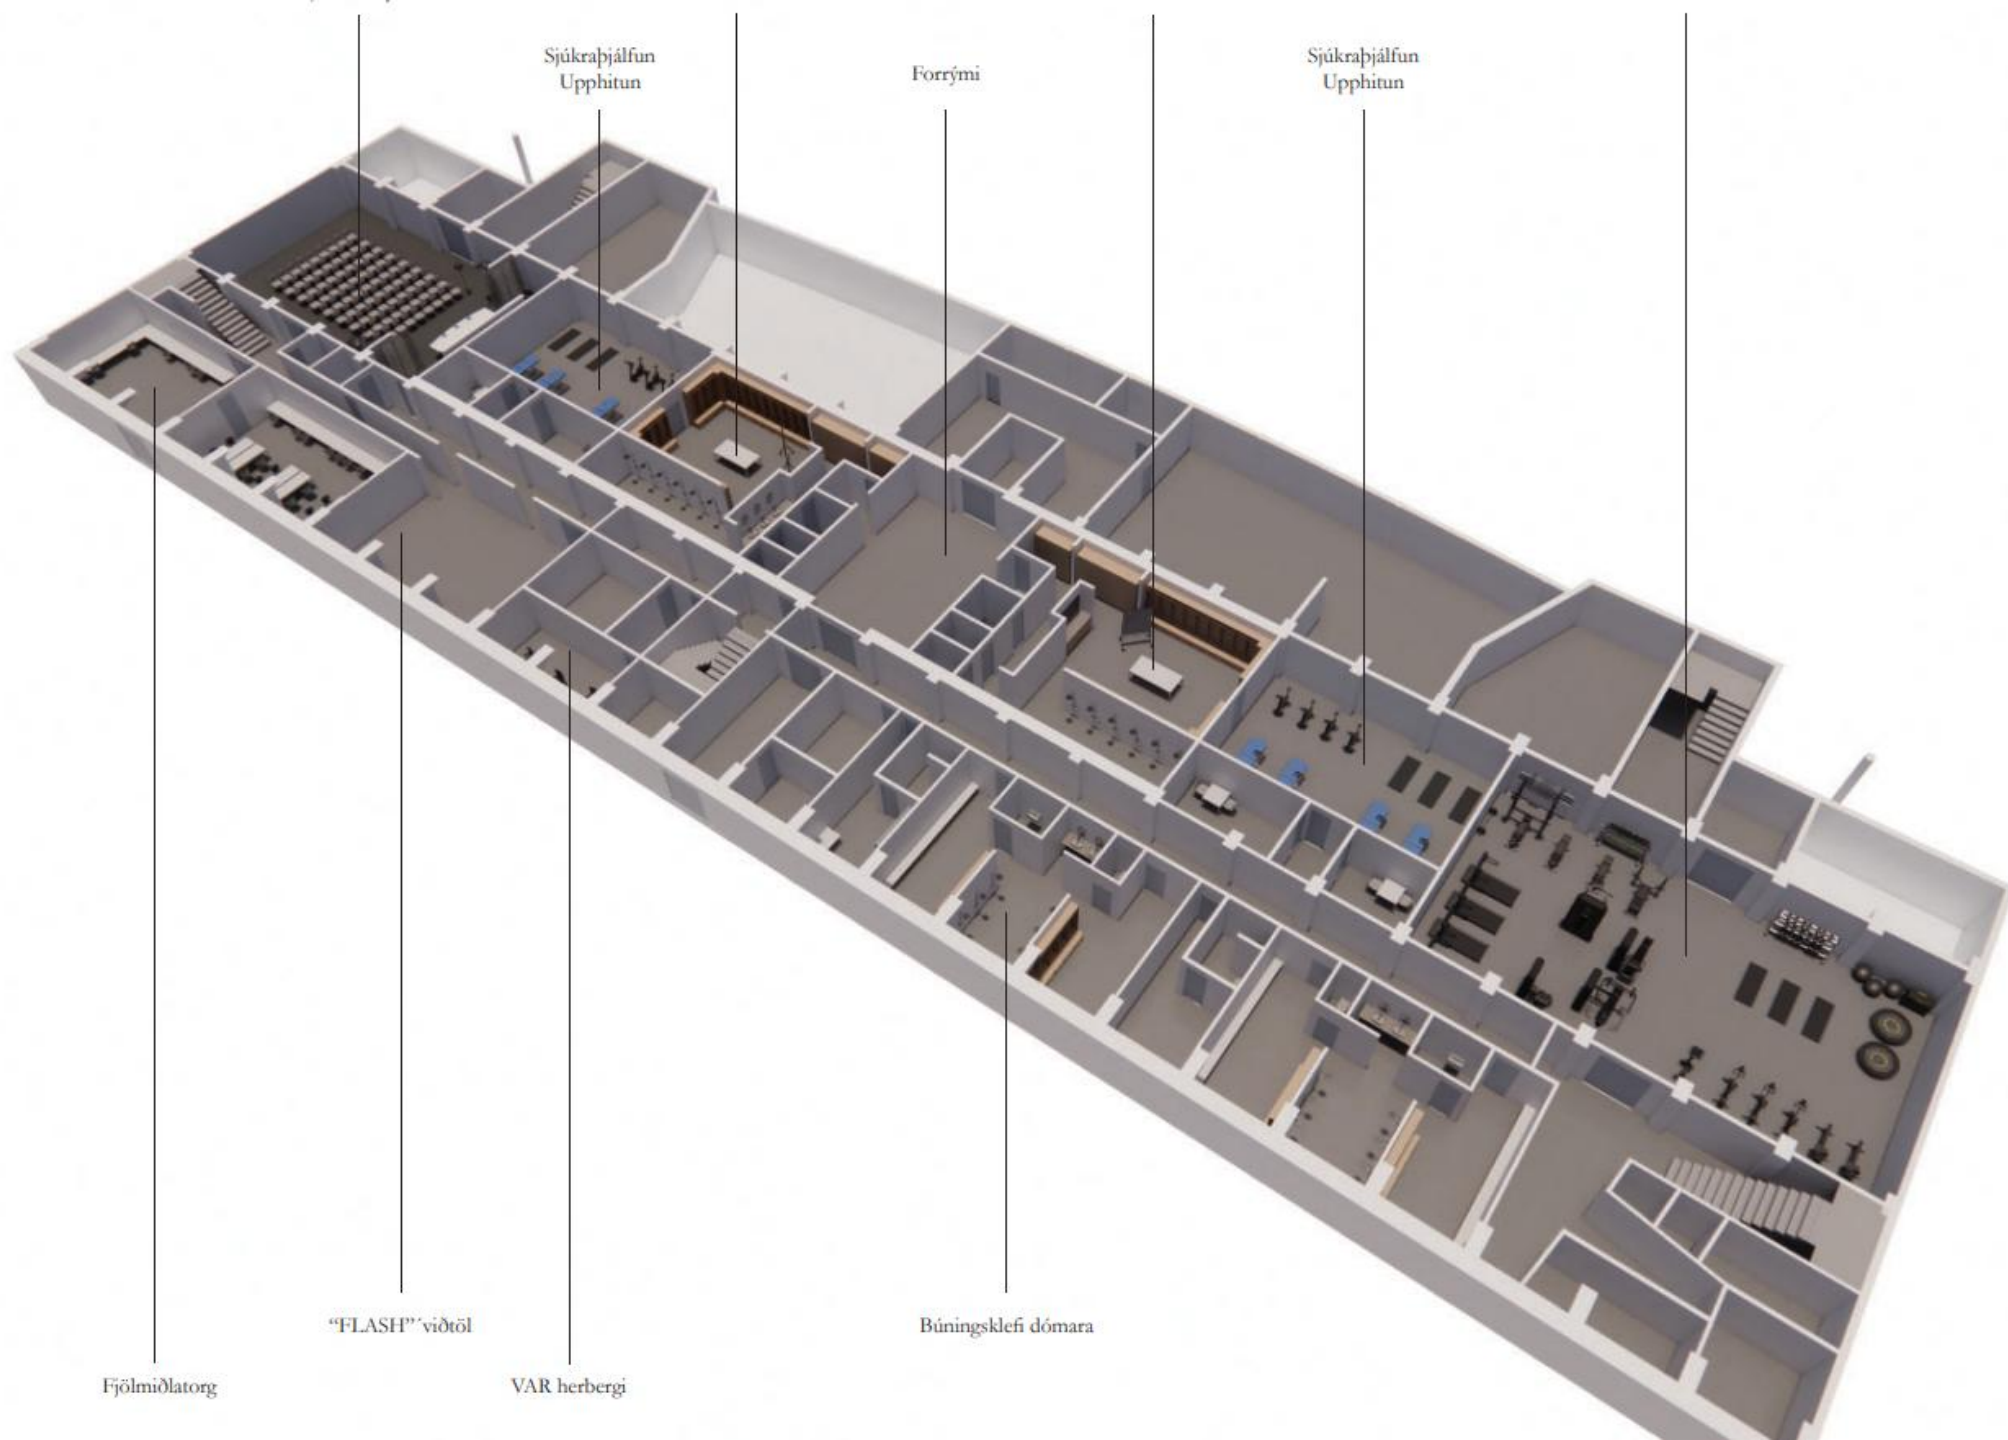

Sjúkrahjálfun
Upphitun

Forrými


Sjúkrahjálfun
Upphitun

Fjölmiðlateg

“FLASH” viðtöl

VAR herbergi

Búningsklefi dómara

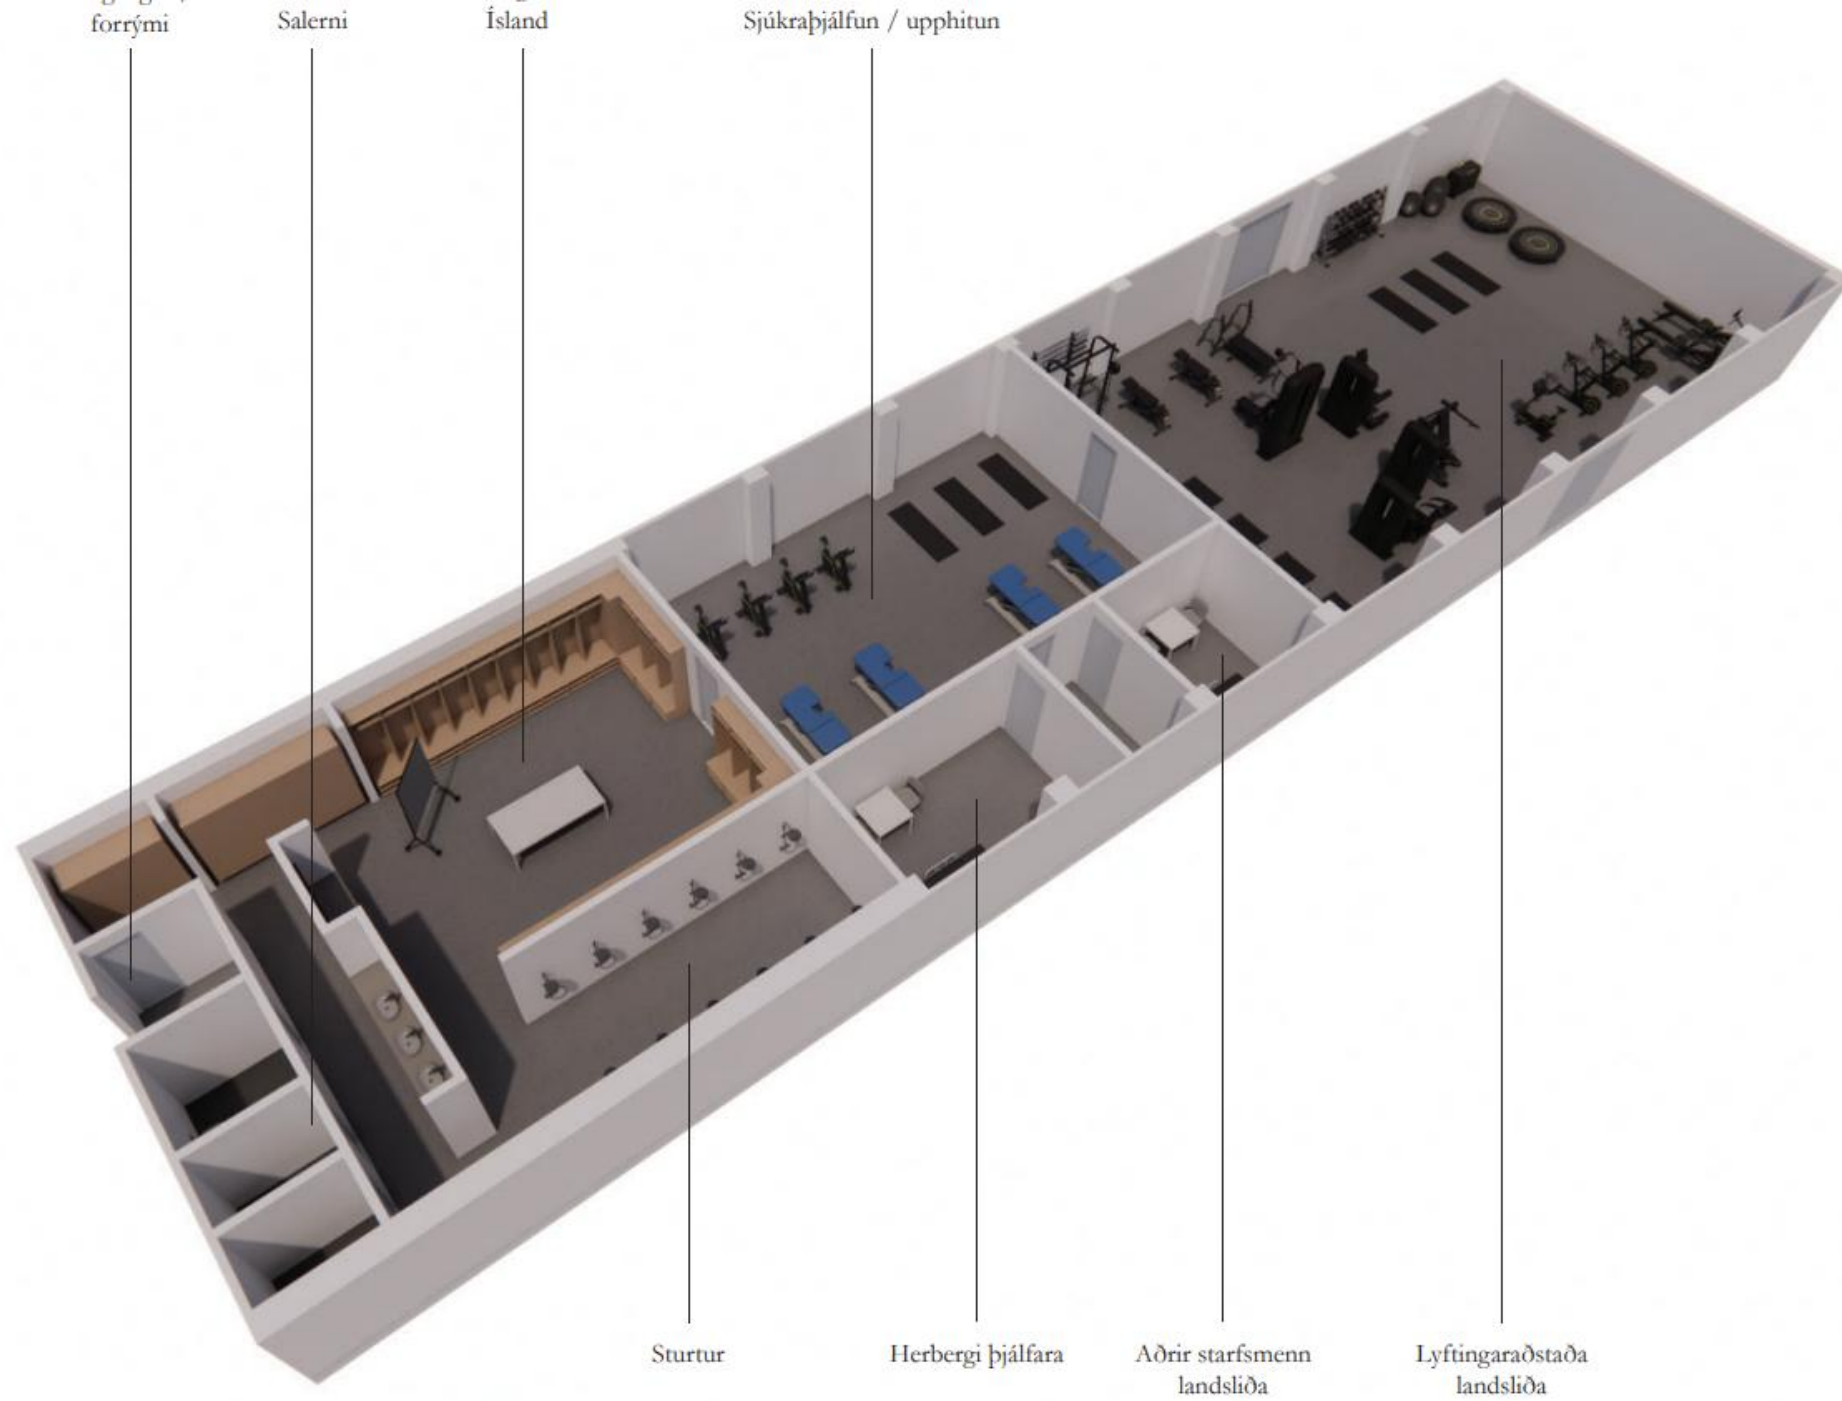

Stjórn Þjóðarleikvangs

- Ríki og Reykjavíkurborg komu á laggirnar stjórn um framtíðaráform og rekstur vallarins ásamt uppbyggingu á vellinum.
- Það sem fyrir stjórninni liggur er að ljúka fjármögnun fyrir lagfæringum og breytingum innandyra ásamt lagfæringum á sjálfri stúkubyggingunni. Eru kostnaðaráætlanir í vinnslu og þá í framhaldinu að skoða og ákveða næstu skref varðandi nýja stúku kringum völinn.
- Sú aðgerð mun fara í ferli opinberra innkaupa, arkitektasamkeppni og áfangaskiptingu. Þá verða allar þessar framkvæmdir boðnar út þegar ákvarðanir liggja fyrir.
